




Urząd Miasta w Zamościu
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZA 2025 ROK

Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość
tel.: 84 677 24 85
e-mail: rewitalizacja@zamosc.pl
Zamojska Akademia Rewitalizacji: www.rewitalizacja.zamosc.pl

W dniu 31 sierpnia 2022 r. w oparciu o sporządzoną diagnozę, Rada Miasta Zamość podjęła Uchwałę Nr XLIX/689/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zamość. Gminny Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030, przyjęty został Uchwałą Nr LXXII/931/2024 Rady Miasta Zamość w dniu 25 marca 2024 r. Podstawą prawną przy sporządzaniu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zamość była ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późniejszymi zmianami). Obszar rewitalizacji prezentuje poniższy rysunek.

Rysunek 1. Obszar zdegradowany i rewitalizacji Miasta Zamość

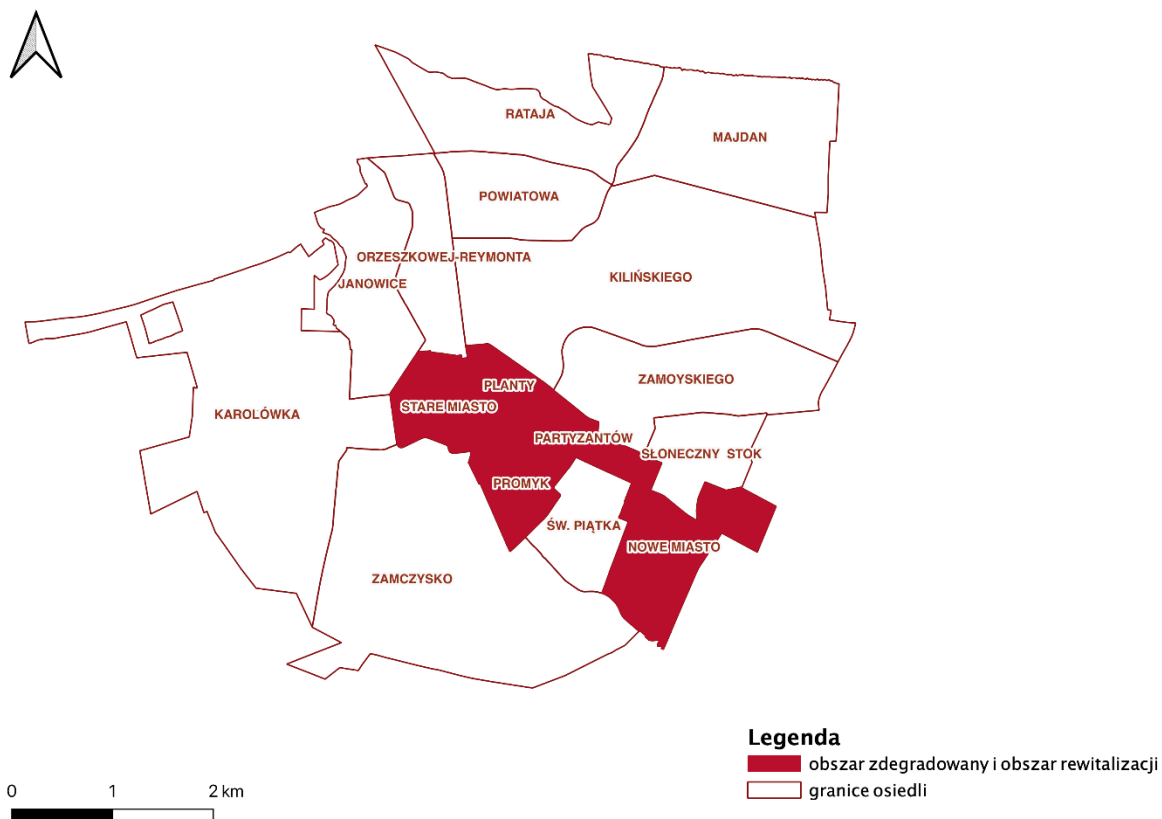

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. Gminny Programu Rewitalizacji Miasta Zamość to dokument, który określa działania i kierunki rozwoju na rzecz poprawy jakości życia podejmowane przez samorząd oraz wszystkich interesariuszy w tym: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i społeczną w obszarze

rewitalizacji. Przeprowadzona diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych pozwoliła zidentyfikować skalę potrzeb rewitalizacyjnych i określić cele programu. Jego założenia ułożone zostały w hierarchii - od celów strategicznych po działania. Wyznaczenie konkretnych założeń jednostkowych poprzedziło określenie wizji stanu obszaru po rewitalizacji, która jest spójna z głównym celem programu rewitalizacji. Istotnym elementem GPR jest jego komplementarność międzyokresowa rozumiana jako kontynuowanie działań (projektów) z wykorzystaniem źródeł finansowania z różnych programów operacyjnych na te same cele. Takie podejście prowadzi do zachowania ciągłości procesów rewitalizacyjnych mających już swoją historię (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017 – 2023), a także umożliwia wykorzystanie dotychczasowego dorobku rewitalizacyjnego. Wzajemne powiązania środowiskowe, gospodarcze i społeczne są fundamentalne dla zrozumienia dynamiki współczesnego społeczeństwa i jego oddziaływania na procesy zachodzące w otoczeniu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju łączy te trzy obszary, dążąc do harmonijnej równowagi między potrzebami gospodarczymi, społecznymi a ochroną środowiska. Wzrost gospodarczy powinien być zgodny z potrzebami społecznymi i jednocześnie nie powinien naruszać równowagi ekologicznej. Program Rewitalizacji Miasta Zamość zawiera przedsięwzięcia, które uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społecznego przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przedstawione w GPR zostały wyłonione w procesie partycypacyjnego modelu społecznego. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja społeczna jest warunkiem koniecznym procesu rewitalizacji, będąc podstawą każdego jego etapu – od przygotowania programu rewitalizacji przez wdrożenie po jego ocenę. Włączenie społeczne w etap zarządzania, wdrażania oraz oceny programu rewitalizacji jest realizowane z udziałem Komitetu Rewitalizacji, który został powołany Zarządzeniem Nr 268/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 listopada 2024 roku. Komitet Rewitalizacji to organ umożliwiający współpracę i dialog przedstawicieli miasta i interesariuszy procesu rewitalizacji reprezentujących stronę społeczną, pełni też funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. Zasady działania komitetu, jak również zasady wyboru jego składu zostały określone w Uchwale Rady Miasta Nr VII/64/2024W z dnia 30 września 2024 roku, której projekt został poddany konsultacjom społecznym.

Potencjalni beneficjenci programu mieli możliwość wpisania własnych projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekty można było zgłaszać na tzw. „formularzu karty przedsięwzięcia”. Projekty z listy podstawowej w większości będą ubiegać się o pozyskanie

unijnych środków na realizację np. z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Projekty uzupełniające przyczynią się do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji w tym poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznych. Ich finansowanie zostało lub zostanie zapewnione ze środków miasta oraz środków krajowych. Poza projektami o charakterze inwestycyjnym (projekty twarde - infrastrukturalne) na liście znalazły się również projekty z zakresu integracji społecznej, czy też edukacji zwane projektami „miękkimi”. Projekty miękkie są ściśle powiązane z planowanymi inwestycjami i są adresowane zarówno do mieszkańców obszaru, jak i miasta. Należy zaznaczyć, że większość projektów złożonych przez beneficjentów realizowana będzie na obszarze rewitalizacji, który jednocześnie jest obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Starego Miasta w Zamościu wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/47, A/48 oraz obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obszar Starego Miasta Zarządzeniem Prezydenta RP został uznany za Pomnik Historii pn. „Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku”. Równie ważną formą ochrony zabytków jest prowadzona przez Miasto Zamość Gminna Ewidencja Zabytków.

Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość korzystania zarówno z funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim kredyty, pożyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą być wspierane przez środki własne przedsiębiorstw i innych podmiotów prywatnych i pozarządowych. Na etapie realizacji zapisów GPR bardzo istotna jest współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe znaczenie mają środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie, środki budżetu Państwa. Należy wspomnieć o tym, że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które można wykorzystać planując i realizując działania rewitalizacyjne.

Poniższe tabele i wykresy prezentują postępy w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030.

Tabela nr 1. Lista projektów podstawowych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030.

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
1.	Renowacja konserwatorska elewacji kamienicy „Domu Centralnego” wraz z modernizacją dachu – rejestr zabytków A/1200.	ZREALIZOWANY	Miasto Zamość	3 671 611,60zł	3 500 000,00 zł	370 089,60zł	3 301 522,00 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zapewnienie niezależności energetycznej w obiektach Miasta Zamość (PV pompy ciepła, kogeneracja) zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanych 4 osiedli.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość	0,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru Bonifratrów (obecnie budynek mieszkalny) – etap I przy ulicy Grodzkiej w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość	0,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru Bonifratrów (obecnie budynek mieszkalny) – etap II przy ulicy Greckiej w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość	0,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Przebudowa ścieżki rowerowej do Drogi Męczenników Rotundy na Osiedlu Promyk i Stare Miasto.	W TRAKCIE REALIZACJI (31 grudnia 2024r została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej.	Miasto Zamość	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
		Przewidywana realizacja w latach 2026-2027).								
6.	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ogrodowej oś. Nowe Miasto – zamknięcie pierścienia ścieżek wokół miasta.	W TRAKCIE REALIZACJI (31 grudnia 2024r została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Przewidywana realizacja w latach 2026-2027).	Miasto Zamość	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowego – dawnej rezydencji Zamoyskich z przeznaczeniem na Centrum Konferencyjno-Hotelowe. Wpis do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego Nr A/1240. Realizacja trzech etapów: 1. Etap: Proces opracowania dokumentacji przedprojektowej. 2.Etap: Proces opracowania dokumentacji projektowej. 3.Etap: Realizacja przedsięwzięcia.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość	0,00 zł	108 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
8.	Budowa oraz rozbudowa sytemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Zamość w obszarze osiedli: Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Promyk oraz Stare Miasto.	W TRAKCIE REALIZACJI	Miasto Zamość	750 006,10 zł	4 500 000,00 zł	112 500,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	637 505,18 zł	0,00 zł
9.	Rewitalizacja części budynku Nadszańca Bastionu VII oraz przyległej Kazamaty Kurtyny VI-I.	W TRAKCIE REALIZACJI (W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji centralnego ogrzewania. Zadanie planowane do realizacji w 2026 r.).	Miasto Zamość	38 130,00 zł	3 500 000,00 zł	38 130,00 zł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Rewitalizacja kwarty południowo-zachodniej Rynku Nowego Miasta.	W TRAKCIE REALIZACJI	Miasto Zamość	358 589,64 zł	600 000,00 zł	328 663,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 926,00 zł	0,00 zł
11.	Rewitalizacja elewacji Domu Centralnego: odtworzenie kariatyd, maszkaronów.	NIEZREALIZOWANY (brak środków)	Miasto Zamość Zakład Gospodarki Lokalowej Osoba prywatna	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, z niezbędną do prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	NIEZREALIZOWANY (brak środków)	Miasto Zamość Zakład Gospodarki Lokalowej	0,00 zł	16 542 954,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
13.	Rozbiórka budynku komunalnego położonego przy ul. Peowiaków 82 i 84.	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość Zakład Gospodarki Lokalowej	0,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Remont elewacji i dachu, wykonanie instalacji c.o. w kamienicach – dawne zabudowania klasztoru Bonifratrów.	NIEZREALIZOWANY (brak środków)	Zakład Gospodarki Lokalowej	0,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.	Remont elewacji i dziedzica Rynek Wielki 1-5a Kolegiacka 10-14.	NIEZREALIZOWANY (brak środków)	Zakład Gospodarki Lokalowej	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Utworzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Seniorów „Blisko domu” oraz dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 5 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	NIEZREALIZOWANY	Zakład Gospodarki Lokalowej Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	Integracja i aktywizacja seniorów w tworzonym środowiskowym ośrodku wsparcia „Blisko domu”.	NIEZREALIZOWANY	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	5 338 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Zapewnienie niezależności energetycznej budynku Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Orlicz Dreszera 2.	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Zapewnienie niezależności energetycznej budynku MCPR przy ul. Lwowskiej 57.	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
20.	Budowa nowej siedziby dla instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny na terenie Miasta Zamość.	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	13 767 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21.	Rozwój specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla rodzin w nowo wybudowanym budynku dla instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny na terenie Miasta Zamość	NIEZREALIZOWANY	Miasto Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	812 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22.	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Promyk – budowa boiska wielofunkcyjnego do uprawiania gier zespołowych /piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa/.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość Zarząd Osiedla Promyk	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23.	Rewitalizacja terenów zielonych bulwarów nad rzeką Łabuńką na osiedlu Promyk – budowa ciągów pieszo-rowerowych, małej architektury.	W TRAKCIE REALIZACJI	Miasto Zamość Zarząd Osiedla Promyk	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24.	Kontynuacja remontu konserwatorskiego Nadszańca K1 Bastionu VI – siedziby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu: wentylacja pomieszczeń lekcyjnych i węzłów sanitarnych – Etap II w obiekcie zabytkowym Nadszańca K1-Bastionu VI w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu - Ekonomik	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
	Kontynuacja projektu wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023 pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu.									
25.	Kontynuacja remontu konserwatorskiego Nadszańca K1 Bastionu VI – siedziby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu: wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej w pomieszczeniach parteru i I piętra oraz przebudowa odwodnienia obiektu. Kontynuacja projektu wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023 pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu - Ekonomik	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
26.	Nowe kompetencje zawodowe szansą na lepszą przyszłość w Centrum Edukacyjno – Integracyjnym oraz Klubie Rozwoju Zawodowego. Kontynuacja projektu wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023 pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu - Ekonomik	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
27.	Rewitalizacja elewacji zespołu kamienic mieszczańskich obiektu Muzeum Zamojskiego wraz ze zwiększeniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ekspozycji muzealnych.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu	0,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.	Piszę, czytam, mówię: JESTEM - pracownia językowa Zamojskiej Akademii Kultury.	NIEZREALIZOWANY	Zamojski Dom Kultury	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
29.	Sezam Teatralny.	NIEZREALIZOWANY	Zamojski Dom Kultury	0,00 zł	1 395 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.	Kolekcjonowanie Pamięci.	NIEZREALIZOWANY	Zamojski Dom Kultury	0,00 zł	840 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.	Zamość Hip-Hop Festiwal.	NIEZREALIZOWANY	Zamojski Dom Kultury	0,00 zł	1 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
32.	Letnie Warsztaty Twórcze.	NIEZREALIZOWANY	Zamojski Dom Kultury	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
33.	Termomodernizacja obiektu z przebudową obszaru i obiektu klasztorного OO. Franciszkanów w Zamościu.	BRAK INFORMACJI	Klasztor OO. Franciszkanów	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
34.	Scalenie przestrzenne i krajobrazowe terenów fortyfikacji z ekspozycją reliktyw i założeń ogrodowych wokół Kościoła Św. Mikołaja w Zamościu.	BRAK INFORMACJI	Zgromadzenie Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu	0,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
35.	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wozowni należącego do zespołu pałacowego d. Rezydencji Zamoyskich z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalną.	W TRAKCIE REALIZACJI (Pozwolenie na budowę i wszystkie przygotowania są gotowe. Czekamy na wynik wniosku o dotację z programu 11.1 Współfinansowanie przez bank BGK z funduszy EFRS zostało odroczone ze względu na priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej).	Przedsiębiorca	200 000,00 zł	17 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
36.	Rewitalizacja - utworzenie podwórka Artystyczno-Kawiarnianego między kamienicami Staszica 27 i Żeromskiego 26 z zabezpieczeniem przed warunkami pogodowo atmosferycznymi oraz umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do siedziby BWA Galerii Zamojskiej i restauracji Skarbiec Wina.	BRAK INFORMACJI	Przedsiębiorca	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
37.	Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Stare Miasto.	W TRAKCIE REALIZACJI (Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych 110-250 mm długość 870 m ul. Lwowska. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja).	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 136 418,41 zł	8 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 136 418,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
38.	Energooszczędna renowacja – poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na osiedlu Nowe Miasto poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz montaż instalacji wykorzystujących OZE.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie przy wsparciu finansowym środków zewnętrznych – interesariusze – osoby prywatne – właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczności nieruchomości w zakresie budownictwa jednorodzinnego – osoby zainteresowane udziałem. Wspólnoty mieszkaniowe/ spółdzielnie mieszkaniowe - w zakresie budownictwa wielorodzinnego ZGL - w zakresie budynków z zasobu komunalnego	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
39.	Uratowanie przed degradacją oraz przywrócenie walorów architektonicznych i znaczenia historycznego zniszczonej XIX-wiecznej Kamienicy dawne „Koszary” przy ul. Stanisława Staszica 3 w Zamościu.	BRAK INFORMACJI	Przedsiębiorca	0,00 zł	8 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
40.	Uratowanie przed degradacją oraz przywrócenie walorów artystycznych i znaczenia historycznego zniszczonego XIX-wiecznego pałacyku miejskiego wraz z oficyną tzw. „Generałówka” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1219.	BRAK INFORMACJI	Przedsiębiorca	0,00 zł	14 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
41.	Odnowa, rewitalizacja i adaptacja zabytkowych kamienic, położonych przy ul. Bazylińska 3 oraz Bazylińska 5, na terenie Starego Miasta Zamość wpisanego do UNESCO.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Przedsiębiorca	0,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
42.	Rewitalizacja, odnowa i adaptacja zabytkowych kamienic wpisanych na listę UNESCO położonych w obszarze Starego Miasta Zamość przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 oraz Kolegiacka 14.	NIEZREALIZOWANY Projekt nie będzie realizowany.	Przedsiębiorca	0,00 zł	7 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
43.	Przebudowa i modernizacja zespołu budynków przy ul. Partyzantów 11 w Zamościu.	BRAK INFORMACJI	Przedsiębiorca	0,00 zł	20 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
44.	Remont kamienicy powstałej przy końcu XIX w.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Przedsiębiorca	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
45.	Modernizacja budynku Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”.	W TRAKCIE REALIZACJI (Zrealizowano w 2024: zakup projektora laserowego dla sali nr3, modernizacja monitoringu wizyjnego, wymiana części oświetlenia ewakuacyjnego, sala nr3: wymiana maskownicy ekranowej, przebudowa kanałów wentylacyjnych, Zrealizowano 2025: zakup projektora laserowego dla sali nr1 i sali studyjnej, wymieniono ekran na Sali nr 2, zmodernizowano fotele na sali nr 3, remont sanitariatów i wymiana bramy garażowej).	Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”	1 421 804,70 zł	6 400 000,00 zł	0,00 zł	481 895,86 zł (dotacja PISF)	939 908,84 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
46.	Adaptacja pomieszczeń po dawnej Bibliotece Pedagogicznej na pracownię plastyczną.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Fundacja	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
47.	Obcowanie ze sztuką jako narzędziem rewitalizującym miejskie przestrzenie publiczne poprzez wykorzystywanie działań twórczych dla rozbudzenia aktywności zamojskiej społeczności oraz krzewienia kultury.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Fundacja	0,00 zł	1 800.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
48.	Remont budynku celem prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Orlicz Dreszera 10.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną KOŁO w Zamościu	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
49.	Termomodernizacja budynku PSONI w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną KOŁO w Zamościu	0,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
50.	Rewitalizacja siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żdanowskiej 3 wraz zagospodarowaniem przyległego terenu- Osiedle Promyk.	NIEZREALIZOWANY (z powodu wykluczenia placówki z działań rewitalizacyjnych określonych w wytycznych do projektu).	Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu	0,00 zł	8 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
51.	Rewitalizacja terenu wraz z modernizacją budynku garażowo – warsztatowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu	W TRAKCIE REALIZACJI (Kontynuacja zadania planowana jest pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie	1 838 386,36 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	1 838 386,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
52.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Szymonowica 19 w Zamościu na Osiedlu Partyzantów.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Wspólnota Mieszkaniowa Szymonowica 18 Zarząd Osiedla Partyzantów	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
53.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kiepur 8 w Zamościu na Osiedlu Partyzantów.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Wspólnota Mieszkaniowa ZDI przy ul. Kiepur 8 Zarząd Osiedla Partyzantów	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
54.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kiepur 10 w Zamościu na Osiedlu Partyzantów.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania	Wspólnota Mieszkaniowa ZDI przy ul. Kiepur 10 Zarząd Osiedla Partyzantów	0,00 zł	1 780 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł


L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
		środków finansowych).								
55.	Termomodernizacja 4 budynków wielorodzinnych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej Kiepur 16 w Zamościu na osiedlu Partyzantów.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Kiepur 16 w Zamościu Zarząd Osiedla Partyzantów	0,00 zł	3 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
56.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kiepur 7 w Zamościu na Osiedlu Partyzantów.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Kiepur 7 w Zamościu Zarząd Osiedla Partyzantów	0,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
57.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szymonowica 15 w Zamościu na Osiedlu Partyzantów.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szymonowica 15 w Zamościu Zarząd Osiedla Partyzantów	0,00 zł	930 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
58.	Budowa wiaty na pojemniki na odpady oraz na dziedzińcu Kamienicy Czarskich.	NIEZREALIZOWANY	Wspólnota Mieszkaniowa Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
59.	Instalacja ciepłej wody użytkowej (CWU) w Kamienicy Czerskich.	NIEZREALIZOWANY	Wspólnota Mieszkaniowa Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60.	Remont klatek schodowych szt. 2 wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i energetycznej w Kamienicy Czerskich.	W TRAKCIE REALIZACJI	Wspólnota Mieszkaniowa Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu	7030,00	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
61.	„Zakorzenieni w historii - Zamojska Akademia Kultury"	NIEZREALIZOWANY	Zamojska Akademia Kultury	0,00 zł	86 000 ,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
62.	"CZYTA SIĘ - otwarta przestrzeń Zamojskiej Akademii Kultury"	NIEZREALIZOWANY	Zamojska Akademia Kultury	0,00 zł	117 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
63.	Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu	W TRAKCIE REALIZACJI	Miasto Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	1 459 217,48 zł	6 508 000,00 zł	507 033,41 zł	828 114,59 zł	124 069,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
64.	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość	W TRAKCIE REALIZACJI	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	157 932,43 zł	490 000,00 zł	122 000,00 zł	0,00 zł	35 932,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
65.	Wsparcie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją.	W TRAKCIE REALIZACJI	Miasto Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	1 228 706,20 zł	910 000,00 zł	564 344,00 zł	630 000,00 zł	34 362,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.			Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne		Prywatne (środki własne)	Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFŚ/FS
66.	Polityka Senioralna (EFS+)	NIEZREALIZOWANY	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	0,00 zł	7 095 790,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
67.	Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych	W TRAKCIE REALIZACJI	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	5 307 356,06 zł	21 000 000,00 zł	0,00 zł	5 307 356,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
68.	Świadczenie usług opieki wytchnieniowej	W TRAKCIE REALIZACJI	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	528 995,86 zł	5 880 000,00 zł	0,00 zł	528 995,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
69.	Korpus Wsparcia Seniorów	W TRAKCIE REALIZACJI	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	176 604,88 zł	1 180 000,00 zł	35 320,99 zł	141283,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70.	CIS DLA CIEBIE	NIEZREALIZOWANY	Centrum Integracji Społecznej w Zamościu	0,00 zł	1 586 183,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stan realizacji projektów z listy podstawowej (tabela nr 1), na siedemdziesiąt projektów wpisanych na listę, zrealizowano jeden projekt, siedemnaście projektów jest w trakcie realizacji, a czterdzieści sześć projektów nie zostało zrealizowanych. Brak informacji szczegół projektów (nie udzielono informacji).

Wykres 1. Stan realizacji projektów z listy podstawowej.

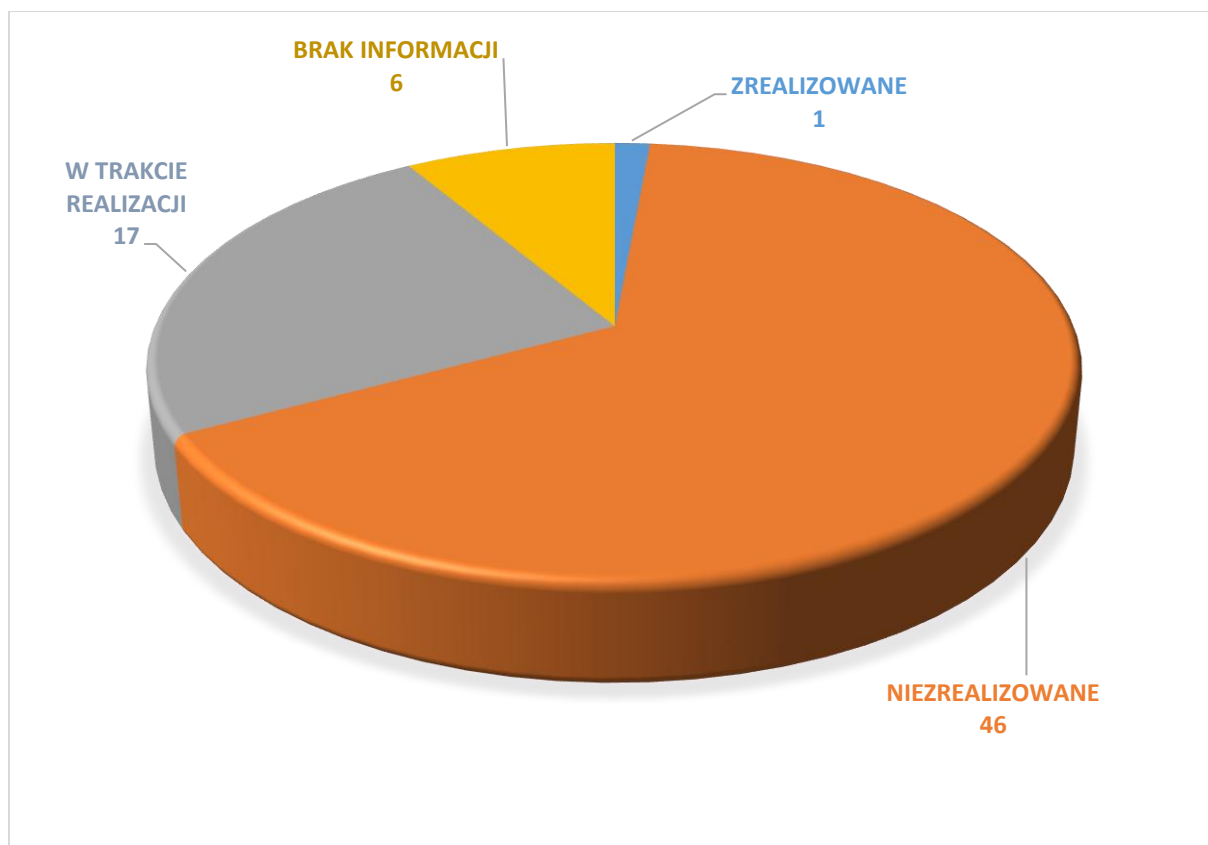

Źródło: opracowanie własne


Tabela nr 2. Lista projektów uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030.

L.p	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.		Prywatne (środki własne)	Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne			Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
1.	Remont mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej Rejestr Zabytków A/48.	W TRAKCIE REALIZACJI (Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej).	Miasto Zamość	15 000,00 zł	400 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu.	W TRAKCIE REALIZACJI (W 2024 opracowano dokumentację projektową i wykonano została renowacja płyt cokołowych kamienicy przy ulicy Staszica 21. W kamienicy przy ulicy Staszica 23 renowacji została poddana elewacja, płyty cokołowe, tynki oraz łuki na filarach, tynki na ścianach nad filarami. W kamienicach przy ulicy Staszica 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 renowacji poddano płyty cokołowe wraz z iniekcją filarów. W kamienicy przy ulicy Staszica 39 renowacji poddano płyty cokołowe z piaskowca przy filarach wraz z iniekcją filarów, zamontowano rury spustowe z blachy miedzianej, wykonano tynki na filarach).	Miasto Zamość	651 952,60 zł	500 000,00 zł	161 952,60 zł	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p	Tytuł projektu	Status projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków projektu na dzień 31.12.2025 r.	Szacowana wartość projektu PLN	Źródła finansowania na dzień 31.12.2025 r.		Prywatne (środki własne)	Dofinansowanie na dzień 31.12.2025 r.	
						Publiczne			Fundusze UE	
						Miasto Zamość	Krajowe		EFRR	EFS/FS
3.	Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza Miejskiego w Zamościu.	W TRAKCIE REALIZACJI (Wykonano renowację tynków i elementów kamiennych schodów, prace konserwatorskie i renowacyjne drzwi zewnętrznych wejściowych ze schodów wachlarzowych Ratusza Miejskiego oraz drzwi zewnętrznych do Straży Miejskiej, renowację mechanizmu zegara Wieży Ratuszowej).	Miasto Zamość	524 316,10 zł	500 000,00 zł	113 242,06 zł	411 074,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Renowacja bramy do Parku Miejskiego w Zamościu.	NIEZREALIZOWANY (Z powodu braku dofinansowania z RPOZ).	Miasto Zamość	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rewitalizacja Bramy Lwowskiej Starej – II etap.	ZREALIZOWANY	Miasto Zamość	345 536,69 zł	887 483,00 zł	95 536,69 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup pawilonu wystawienniczego z przyległym ogródkiem na organizację plenerowych imprez kulturalnych.	NIEZREALIZOWANY (Planowana jest realizacja pod warunkiem pozyskania środków finansowych).	Miasto Zamość Książnica Zamojska	0,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stan realizacji projektów z listy uzupełniającej (tabela nr 2), na sześć projektów wpisanych na listę, jeden projekt zostało zrealizowany, trzy projekt są w trakcie realizacji oraz dwa projekty nie został zrealizowane.


Wykres 3. Stan realizacji projektów z listy uzupełniającej.

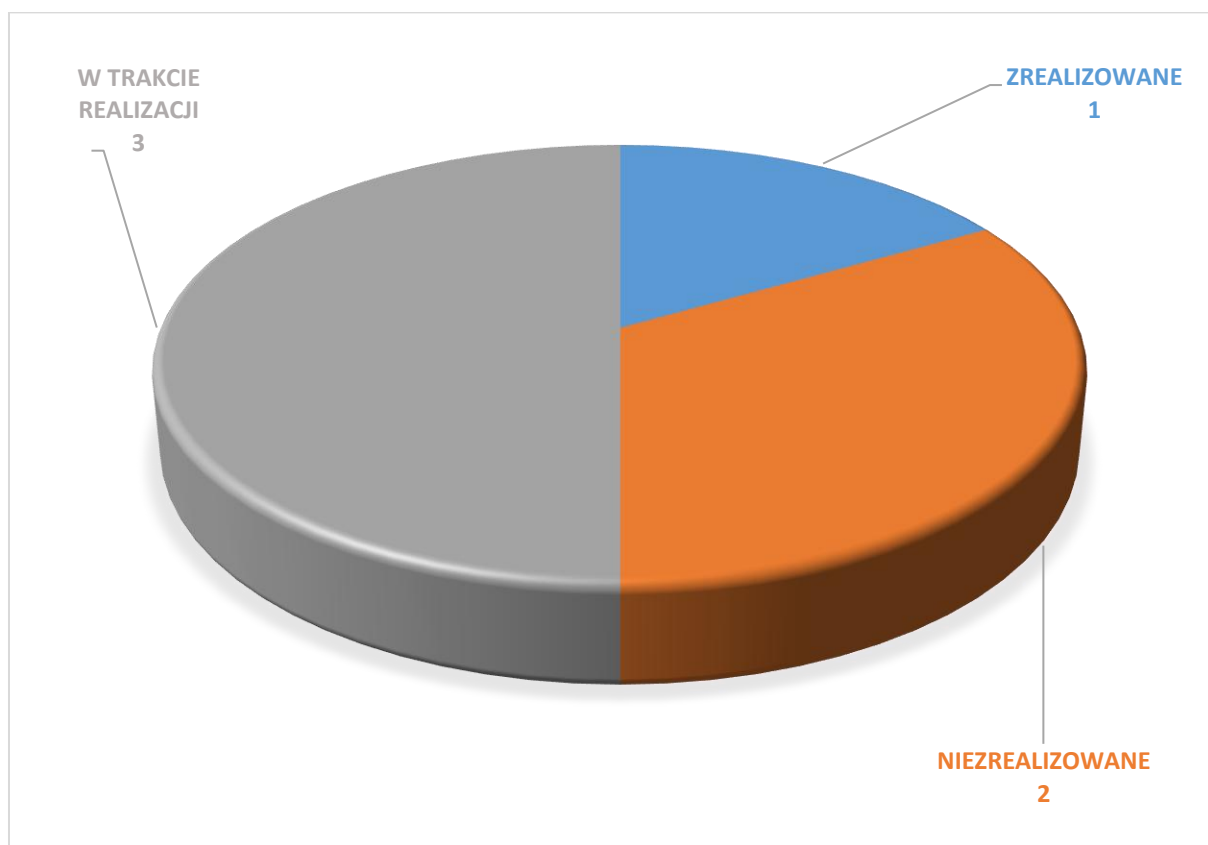

Źródło: opracowanie własne

Poniżej przedstawiony wykresy obrazuje udział realizacji wszystkich projektów, które zostały wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030. Stan realizacji projektów z listy podstawowej oraz z listy uzupełniającej (tabela nr 1 i tabela nr 2), na siedemdziesiąt sześć projektów wpisanych na listę, dwa projekt został zrealizowane, dwadzieścia projektów jest w trakcie realizacji, a czterdzieści osiem projektów nie zostało zrealizowanych. Brak informacji sześć projektów (nie udzielono informacji).

Wykres 5. Stan realizacji projektów z listy podstawowej oraz z listy uzupełniającej.

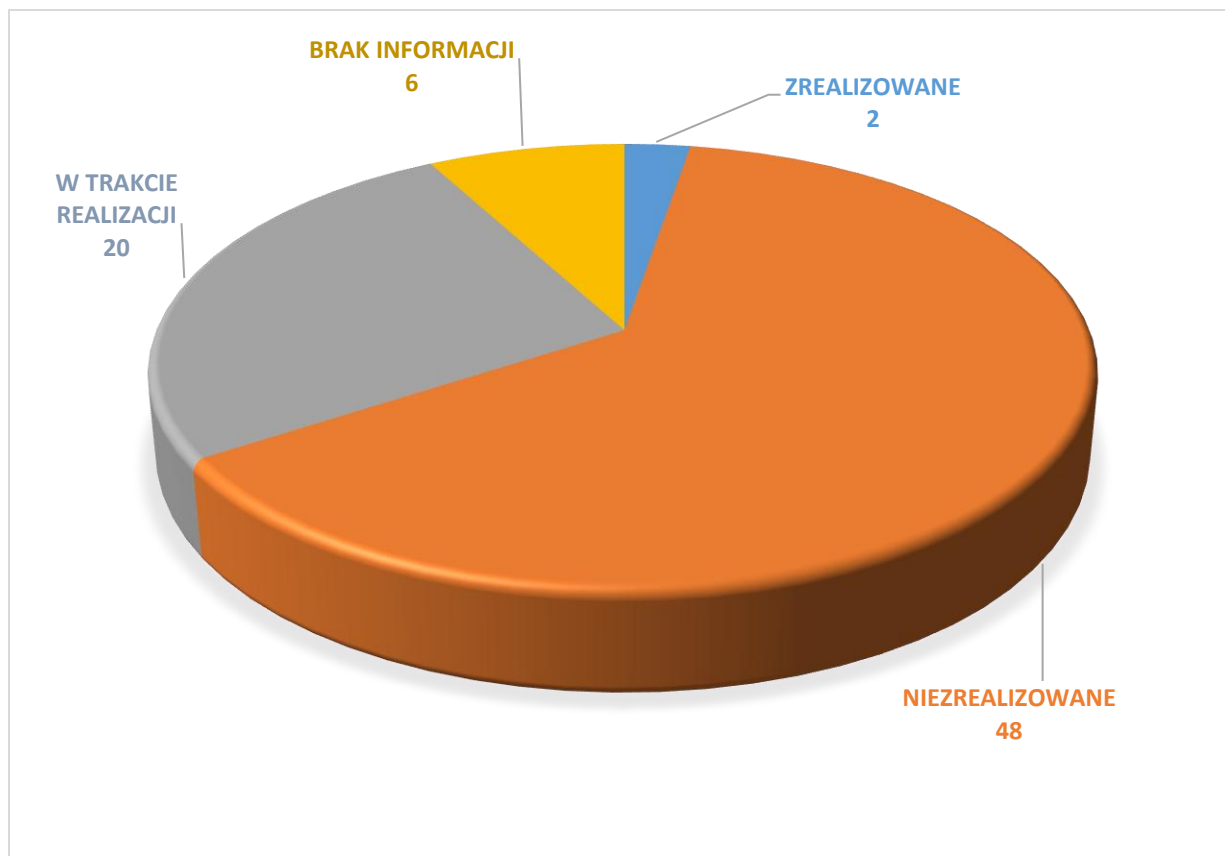

Źródło: opracowanie własne

Sporządził: inspektor Artur Piaseczny
